


# ASÍ AVANZA EL



# fideicomiso educativo

LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR



# Línea temporal


Se promulga la ley

Banco Nacional instala la Unidad Ejecutora





**ASÍ AVANZA EL**



**fideicomiso**  
**educativo**  
LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR

**Lo que nos encontramos**  
**en el 2014**



**ASÍ AVANZA EL**




# UN PROYECTO IMPORTANTE

- Una iniciativa de alto contenido social para impactar en comunidades.
- Necesaria para atender una parte del rezago en infraestructura educativa.
- Una lista de centros educativos.
- Ley aprobada, estructuración del esquema financiero y contrato entre BID-Banco Nacional.
- Dinero aprobado con inicio de pago de comisiones.



**ASÍ AVANZA EL**



**fideicomiso**  
**educativo**  
LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR


# **SIN CONDICIONES PARA INICIAR EJECUCIÓN**

ETAPA DE PRE INVERSIÓN

- 98% sin estudios, trámites preliminares y sin proyectos arquitectónicos.
- Sin actualización de necesidades de cada centro educativo.
- De los terrenos por comprar no existía identificación de opciones.
- Con costos referenciales del año 2010 que debían actualizarse.



**ASÍ AVANZA EL**




**fideicomiso**  
**educativo**  
LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR

**¡Tener el financiamiento no es suficiente para empezar construcción!**



**ASÍ AVANZA EL**



**fideicomiso**  
**educativo**  
LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR

**El trabajo realizado a partir**  
**del 2014**



**ASÍ AVANZA EL**



**ADQUISIÓN DE TERRENOS**

**8-18**  
meses

**ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTOS**

**PREPARACIÓN CARTELES**

**1-3**  
meses

**PROCESO DE ADJUDICACIÓN**


**3-7**  
meses

**EJECUCIÓN Y EQUIPAMIENTO**

**4-12**  
meses



**ASÍ AVANZA EL**



**fideicomiso**  
**educativo**  
LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR

# BALANCE

## de la ejecución

# 2

## centros construidos



**COLEGIO MATA DE PLÁTANO**  
**San José, Goicochea**  
INICIO 12 enero 2015  
ENTREGADO 11 setiembre 2016




**LICEO RURAL SAN ISIDRO DE LEÓN CORTÉS**  
**San José, León Cortés**  
INICIO 12 de enero 2015  
ENTREGADO 5 noviembre 2016

# 5 centros en construcción



**ESCUELA FINCA LA CAJA**  
**La Carpio, San José**  
INICIO 19 junio 2017  
PARA ENTREGAR: 19 abril 2018 (IyII  
etapa)

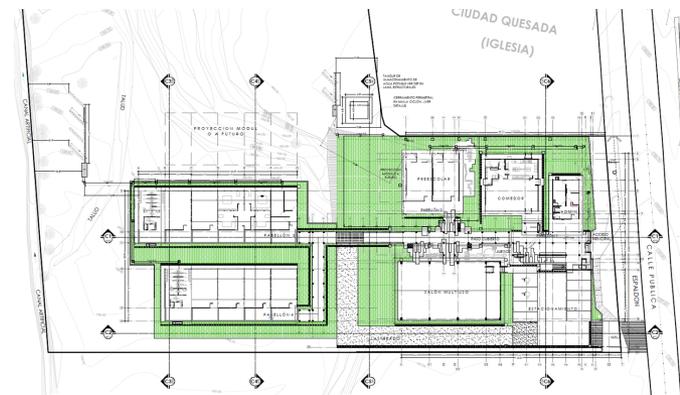

**ESCUELA SAN JOSÉ**  
**Aguas Zarcas, San Carlos**  
INICIO 22 noviembre 2017  
PARA ENTREGAR 22 abril 2018



Cancha Multiusos  
CTP Tronadora  
Tilarán, Guanacaste



Cancha Multiusos  
CTP Carrizal  
Alajuela



Cancha Multiusos  
Colegio San Rafael  
Abangares, Guanacaste

**30** centros firma contratos  
y orden de inicio

**27** centros completos

**3** canchas multiusos



CTP San Rafael  
Alajuela centro



Colegio Puente de Piedra  
Grecia, Alajuela



Colegio Occidental  
Cartago centro

# 18

**centros por firmar  
contrato con empresa  
constructora**

**10 centros completos**

**8 canchas multiusos**



Telesecundaria San  
Luis  
Upala, Alajuela



Escuela Finca 6 - 11  
Osa, Puntarenas

# 38

**centros con avances**

**32** con anteproyecto  
completo

**23** fue necesario  
comprar terrenos



Escuela Finca El  
Quemado  
San José, Pérez  
Zeledón



Liceo Rural La Gata  
Sarapiquí, Heredia



Colegio Juntas de  
Coaba  
La Cruz, Guanacaste



Liceo Rural Mastatal  
Puriscal, San José




La DICE del MEP realizó la más alta inversión histórica asociada a proyectos concretos

La inversión a través de la DICE, supera en dos veces y media la que se realiza vía Fideicomiso.

Esta inversión, si bien ha sido fundamental, no resuelve el rezago que en esta materia acumuló el país durante décadas.

# ASÍ AVANZA EL



# fideicomiso educativo

LEY N° 9124-MEP-BID-BNCR

